











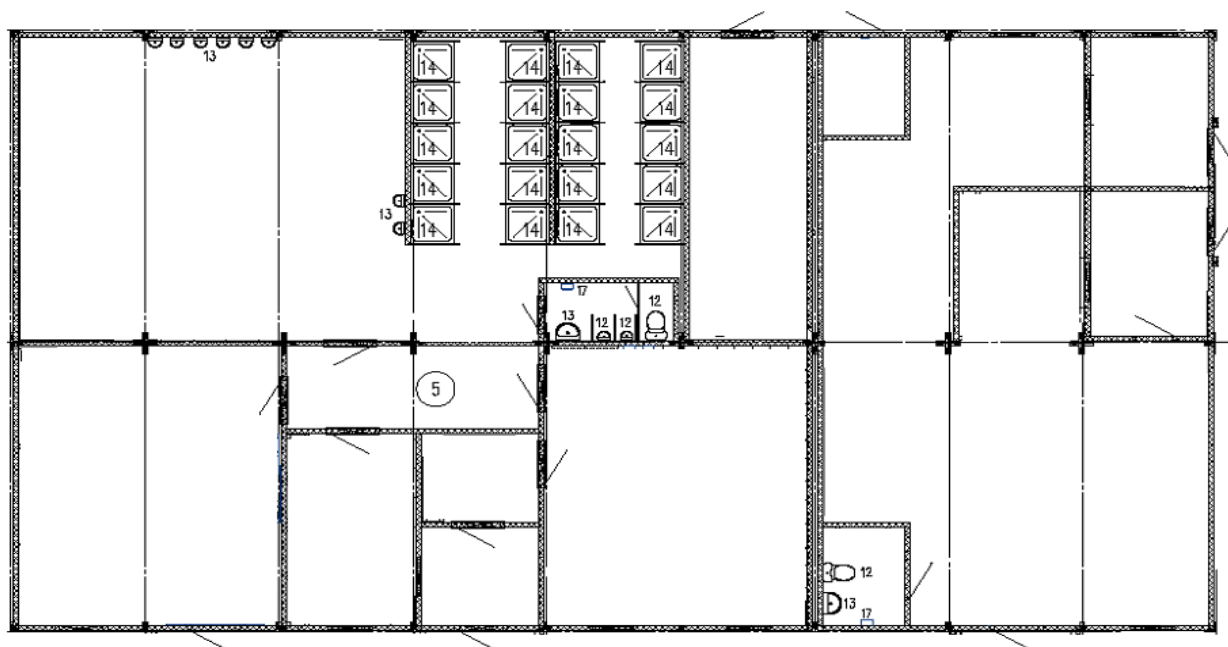

количество модулей	18 модулей		
габаритный размер	21 915	Х	12 110 мм
количество этажей	1 этажа		
общая площадь	265,39 м ²		
высота потолка в чистоте	2 700 мм		



	Несущий каркас отдельного модуля "Стандартный"	Размер контейнера	6055x2435x2950 мм		Каркас стальной, сборно-разборный, болтовое соединение с рамами. Прямоугольный высокопрочный каркас из металлических профилей гнутых из листа 3 мм и 4 мм, фитинги из листа 6 мм и 10 мм. Грунтование алкидным праймером, окраска эмалью алкидной по металлу.
		Размер коридора	4885x2435x2950 мм		
		Высота нижнего пояса	140 мм (из 3 мм листа)		
		Высота верхнего пояса	196 мм (из 3 мм листа)		
		Размеры стоек	152x180 мм (из 4 мм листа)		
		Цвет каркаса	RAL 9002		
	Общая кровля (без водостока)	Фермы из трубного профиля	60x40x3 мм и 80x40x3 мм (соединение болтовое сборно-разборное)		
		Профлист	НС35 0,7 мм (с полимерным покрытием)	RAL 5015	
	Потолок	Верхний слой	Завальцованный лист оцинкованный 0,7 мм (1 фальц, проходящим через всю длину контейнера)		
		Средний слой	Утеплитель НГ минеральная вата толщиной 200 мм		
		Пароизоляция	Изоспан		
		Нижний слой	ЛМДФ (цвет белый)		
		Плинтус потолочный	ЛМДФ (цвет белый)		
	Наружные стены и перегородки	Наружная Отделка	Сэндвич-панель СП-МВП 150 мм	0,5 микропрофиль RAL 9003	0,5 микропрофиль RAL 5015
		Внутренняя Отделка	Сэндвич-панель СП-МВП 100 мм	0,5 микропрофиль RAL 9003	0,5 микропрофиль RAL 9003
	Пол	Плинтус	ПВХ (цвет серый)		
		Отделка	Линолеум коммерческий (цвет серый)		
		Верхний слой	ЦСП 20 мм		
		Пароизоляция	Изоспан		
		Средний слой	Утеплитель НГ минеральная вата толщиной 200 мм		
		Нижний слой	Профлист С8 оцинкованный 0,5 мм		
	Температурный режим	Мин	-50°C		
		Макс	+60°C		
	Окна	ПВХ 850x1100 мм поворотно-откидные 2х камерные			RAL 9003
		ПВХ 570x470 мм в санузле (непрозрачного стекла)			RAL 9003
	Двери	Входная	Металлическая 1200x2000мм, толщина металла 2 мм утепленная		RAL 7004
		Внутренняя	Дверь из вспененного ПВХ Aquadoor, 800x2000мм		RAL 9003
	Отопление	Электро конвектор	Ballu, Electrolux или аналог		
	Электрика (разработка и согласование проекта)	Щит электрический распределительный	IEK,EFK,TDM,DKC или аналог		
		Комплектующие распред. щитов	IEK,EFK,TDM,DKC или аналог		
		Розетки (открытого монтажа с кабель-каналами)	IEK,EFK,TDM,DKC или аналог		
		Выключатели (открытого монтажа с кабель-каналами)	IEK,EFK,TDM,DKC или аналог		
		Светильники светодиодные (открытого монтажа с кабель-каналами)	IEK,EFK,TDM,DKC или аналог		
		ПВХ кабель-каналы	IEK,EFK,TDM,DKC или аналог		
		Проводка открытая ВВГнг-LS и FRLS (3x1,5мм², 3x2,5мм²)	медный		
		Подключение к внешней сети электроснабжения с глухозаземлением осуществляет Заказчик. Подключение здания к контуру заземления осуществляет Заказчик.			
	Сантехника	Разводка воды	ППР трубы		
		Разводка канализации	ПВХ трубы		
		Унитаз	фаянсовый белый в сборе		
		Раковина	со смесителем в сборе		
		Подключение к внешним сетям осуществляет Заказчик			

	Освещение	Панель светодиодная				2 шт. 40 Вт, 595x595 мм, 4000К, 4000 Лм / в каждом контейнере							
	Вентиляция	Вытяжные канальные вентиляторы 100 мм в санузлах											
		В остальных помещения естественная, проветривание через форточку											
	Пожаротушение	Первичные средства пожаротушения				Огнетушитель ОП-4.							
	Название Здания	Этаж	Наименование	Вместимость	Контейнер 6,05x2,43 mt		Коридор 4,88 x 2,43 mt		Общая				
					Штук	Площадь (m2)	Штук	Площадь (m2)	Штук	Площадь (m2)	Площадь Здания(m2)		
		1	Офис		18	265,39	0	0,00	18	265,39	265,39		
	Название Здания												
		ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ (с НДС)	СТОИМОСТЬ КОНТЕЙНЕРА (с НДС)	СУММА ДОСТАВКИ (с НДС)		СТОИМОСТЬ МОНТАЖА (БЕЗ КРАН, ПОГРУЗЧИК И Т.Д.)(с НДС)		СТОИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ ФУНДАМЕНТА (БЛОКИ,ФБС, РАБОЧИЙ,КРАН И Т. Д.)		МЕБЛИРОВКА (МЕБЕЛЬ И Т. Д.) (с НДС)		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ (с НДС)	
	Офис			не включено		не включено		не включено		не включено			

Примечание:

1. Все цены указаны с учетом НДС 22%
- 2.Срок изготовления на графике
3. Порядок платежей: аванс 70%, промежуточный перед отгрузкой 20 %, окончательный расчет 10% после подписания акта.
4. Коммерческое предложение действительно 1 неделя.
5. Гарантийный срок на Модульное здание и выполненные Работы составляет 12 месяцев, за исключением изделий и оборудования, имеющих собственный гарантийный срок, установленный их производителем.
- 6.Стоимость крана несет работодатель. В стоимость не входит стоимость крана.
